



**FOLKETINGET
RIGSREVISIONEN**

Maj 2025

**Rigsrevisionens notat om
beretning om**

Forsvarsministeriets opbygning af en indsættelsesbar brigade

Opfølgning i sagen om Forsvarsministeriets opbygning af en indsættelsesbar brigade (beretning nr. 9/2022)

29. april 2025

RN C104/25

I. Baggrund og konklusion

1. Rigsrevisionen følger i dette notat op på sagen om Forsvarsministeriets opbygning af en indsættelsesbar brigade, som blev indledt med en beretning i 2023. Opfølgningen sker med henblik på at vurdere, om Forsvarsministeriets initiativer adresserer den kritik, der fremgår af Statsrevisorerne bemærkninger og Rigsrevisionens beretning. Vi har tidligere behandlet sagen i notat til Statsrevisorerne af 21. april 2023.

2. Beretningen handlede om, hvorvidt Forsvarsministeriet havde sikret en effektiv styring af opbygningen af en indsættelsesbar brigade.


3. Da Statsrevisorerne behandlede beretningen, så de med stor alvor og bekymring på, at Forsvarsministeriet ikke havde levet op til forsvarsforliget 2018-2023, idet ministeriet ikke ville råde over en indsættelsesbar brigade i 2024. Statsrevisorerne konstaterede, at Folketingets Forsvarsudvalg og forligskredsen var blevet orienteret om forsinkelser i opbygningen af brigaden, men at orienteringerne var for optimistiske i forhold til den reelle fremdrift.

Statsrevisorerne fandt det kritisabelt, at Forsvarsministeriet ikke havde tillægget en effektiv styring af opbygningen af brigaden og kun i begrænset omfang havde fulgt op på økonomi og fremdrift. Ministeriet vidste således ikke, hvordan de ca. 4,4 mia. kr. til opbygningen var anvendt, eller om midlerne rakte til hele projektet.

Det var Statsrevisorerne vurdering, at Forsvarsministeriet burde følge økonomien i et projekt af brigadens størrelsesorden for at kunne leve op til grundlæggende og almindeligt udbredte principper for god statslig økonomistyring. Det manglende overblik udfordrede Forsvarsministeriets og Folketingets muligheder for at styre fremdriften og foretage prioriteringer på et oplyst grundlag.

Statsrevisorerne konstaterede også, at ingen af orienteringerne til forligskredsen havde omhandlet, hvilke konsekvenser forsinkelserne måtte have for den samlede forligsimplicitering og forligsøkonomi.

Sagsforløb for en større undersøgelse

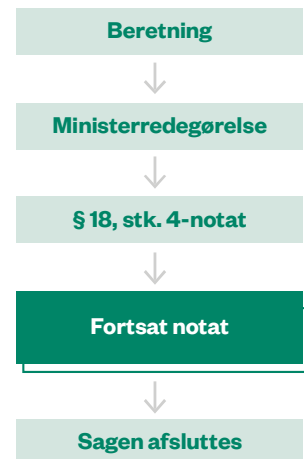

Du kan læse mere om forløbet og de enkelte step på www.rigsrevisionen.dk

Som det fremgår Rigsrevisionens tidligere notat om sagen, følger Rigsrevisionen Forsvarsministeriets arbejde med at styrke forligs- og økonomistyringen på forsvarsområdet. Opfølgning sker i regi af opfølgningen på beretningen om Forsvarsministeriets økonomistyring af forligsmidler i perioden 2018-2023.

Vi følger således i denne sag alene op på Forsvarsministeriets arbejde med at opdatere den interne vejledning for den løbende opfølgning på ministeriets aktstykker.



Konklusion

Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Forsvarsministeriet har opdateret sin interne vejledning for den løbende opfølgning på ministeriets aktstykker, så det fremgår, at aktstykkerne skal forelægges i overensstemmelse med budgetvejledningens tidsfrister.

Rigsrevisionen vurderer på den baggrund, at sagen kan afsluttes.

II. Status på sagen

4. På baggrund af beretningen og Statsrevisorernes bemærkninger har vi fulgt op på følgende punkt:

Et opfølgningspunkt afsluttes, når Statsrevisorerne på baggrund af indstilling fra Rigsrevisionen vurderer, at myndighedernes initiativer er tilfredsstillende.

Opfølgningspunkt	Status
1. Forsvarsministeriets arbejde med at opdatere den interne vejledning for den løbende opfølgning på ministeriets aktstykker.	Behandles og afsluttes i dette notat.

III. Forsvarsministeriets initiativer

5. Vi gennemgår i det følgende Forsvarsministeriets initiativer i forhold til opfølgningspunktet.

6. Opfølgningen er baseret på en gennemgang af fremsendt dokumentation i form af en skriftlig redegørelse samt en gældende vejledning vedrørende aktstykker.

Opdatering af Forsvarsministeriets interne vejledning vedrørende aktstykker

7. Det fremgik af beretningen, at Forsvarsministeriet ikke i alle tilfælde havde forelagt aktstykker for Folketingets Finansudvalg i overensstemmelse med budgetvejledningens regler, hvis der blev konstateret væsentlige ændringer i udgifterne til et projekt.

Det fremgår af budgetvejledningen, at ændringer forelægges for Finansudvalget, hvis ændringen udgør mindst 10 % af projektets totaludgift. Forelæggelse skal ske snarest og senest 3 måneder efter, at institutionen bliver bekendt med, at der vil ske en væsentlig ændring

8. Forsvarsministeren oplyste i sin redegørelse til beretningen, at Forsvarsministeriet selvsagt skal overholde budgetvejledningens tidsfrister for forelæggelse af aktstykker for Finansudvalget. Ministeriet ville på den baggrund opdatere den interne vejledning for den løbende opfølgning på ministeriets aktstykker for at tydeliggøre, hvornår en ændring er væsentlig og derfor kræver forelæggelse for Finansudvalget i henhold til budgetvejledningens tidsfrister.

9. Vores opfølgning viser, at Forsvarsministeriet har opdateret den interne vejledning. Det fremgår af vejledningen, at væsentlige ændringer skal forelægges snarest og senest tre måneder efter, at den væsentlige ændring er erkendt af den projektansvarlige styrelse. Det fremgår også af vejledningen, at departementet skal inddrages, så snart styrelsen har erkendt den væsentlige ændring med henblik på rettidig forelæggelse for eller orientering af Finansudvalget.

Rigsrevisionen finder det tilfredsstillende, at Forsvarsministeriet har opdateret sin interne vejledning, så det fremgår, at aktstykkerne skal forelægges i overensstemmelse med budgetvejledningens tidsfrister.

10. Hele sagen kan følges på www.rigsrevisionen.dk og på www.ft.dk/Statsrevisorerne.

11. Bilag 1 viser Folketingets behandling af beretningen.

Birgitte Hansen

Bilag 1. Folketingets behandling af beretningen

Beretning (nr.), dato for Stats- revisorernes mødebehandling og minister- redegørelse(r)	Behandlet i udvalg	Gennemgang ved Statsrevisorerne og Rigsrevisionen	Udvalgs- spørgsmål (nr.)	Indkaldt til samråd	Statsrevisorerne har holdt møde med ministeren	§ 20-spørgsmål
Forsvarsministe- riets opbygning af en indsættelses- bar brigade (nr. 9/2022) 16-01-2023 Minister- redegørelse: Forsvars- ministeren: 17-04-2023	Finansudvalget: 19-01-2023	Finansudvalget og Forsvarsudvalget: 04-05-2023	Forsvars- ministeren: 19-01-2023 (58)	Forsvarsudvalget: 22-02-2023 Finansudvalget: 23-02-2023	Forsvars- ministeren: 13-03-2023	
